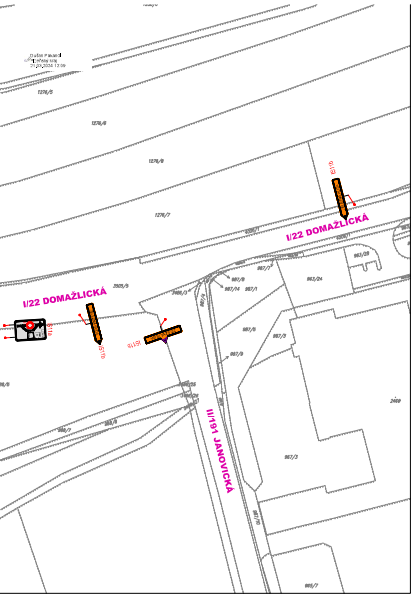

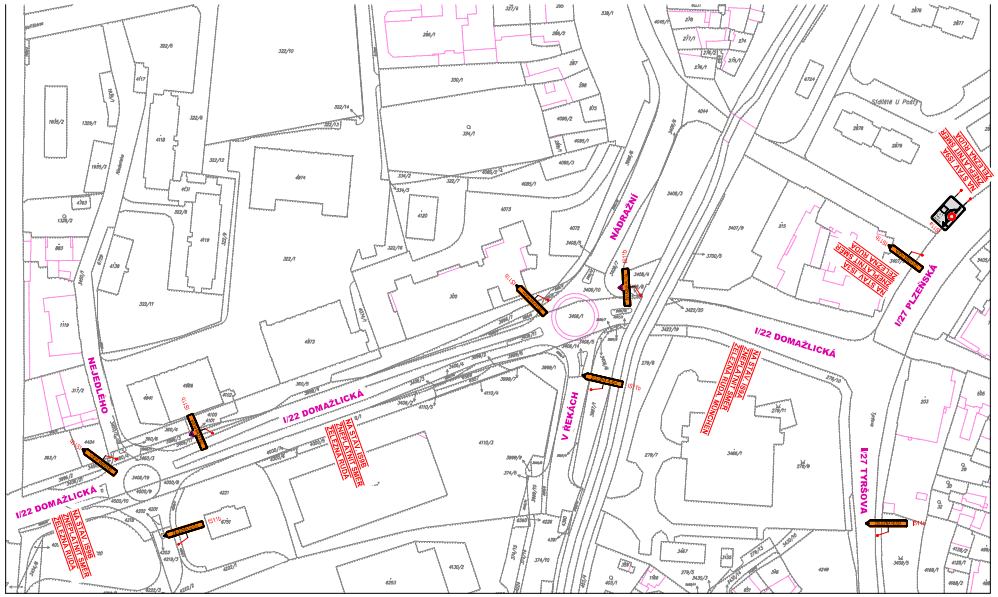

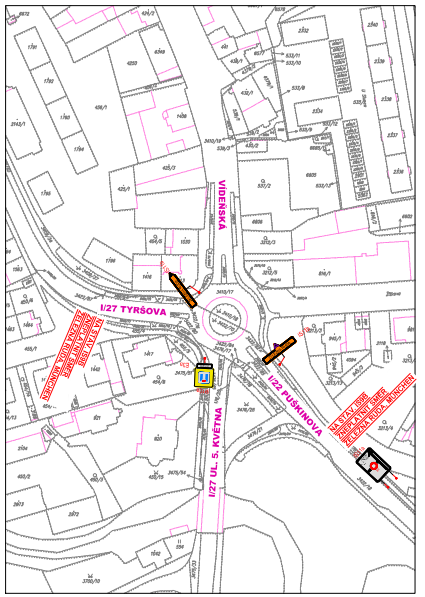

LEGENDA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PRVNÍHO STUPNĚ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT POLICIE
DIS 26 PLZEŇ, VOLYŇSKÁ 5

KRPP-63616-18/ČJ-2023-0300DP
15. 2. 2024

UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU, PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- Dopravní spatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa, DZ budou upevněny na pozpátných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 – 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

ZNEPLATŇOVANÉ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚNO:

- magnetickou páskou/samolepicí páskou o minimální síle 2 mm (nelze použít pro dílkové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- u velkoplošných DZ překrytím přeškrtnutým červeným křížem

Nedoporučuje se jakékoliv použití lepicích fólií nebo pásek!

Navštivte nás na
PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU: Ing. Petr BUDÍN	ODP.PROJEKTANT: Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT: Ing. Petr BUDÍN
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: ŽELEZNÁ RUDA		
STAVEBNÍK: Rozhlasový vysílač a zájmová CR, správa Plzeň			

I/27 ŽELEZNÁ RUDA - STŘED

SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SITUACE PŘECHODNÉHO DZ – ETAPA 3 – OBJÍZDNÁ TRASA – DETAILY

RAZÍTKO

Navštivte nás na
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel. 377 49 32 42, www.projekt.pl
IČ: 26356791, DIČ: CZ26356791

SOUBOR	Objekt151dzetap3.dgn
DATUM	06/2022
STUPEŇ	POPS
ZMĚNA č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARE
1 : 1000	8.
